

Project Monitoring Report

Implementation delivered. Operational continuity structured.

✓ STATUS **Completed**



TAHAP SELANJUTNYA

**Monthly system health and
adoption monitoring**



TERAKHIR DIPERBARUI

20 Agustus 2026

Implementation Delivered, Continuity Secured

Merekam progres pelaksanaan, capaian target, kendala, solusi, pembelajaran, dokumentasi kegiatan, dan rencana tindak lanjut; memastikan solusi telah diterima melalui initial UAT dan handover; serta menjadi materi utama bagian Implementasi Project pada Final Presentation.

AI Co-Creation Lab Makassar berhasil menuntaskan rencana implementasinya bersama 20 mahasiswa, 5 UMKM lokal, 5 tim co-creation campuran, 5 functional MVP, dan 5 sesi initial UAT. Setiap UMKM menguji langsung solusi yang dibangun untuk masalah usahanya dan menerima arah solusi tersebut untuk diserahterimakan serta disempurnakan lebih lanjut.

Kelima sistem telah diserahterimakan. Minggu pertama setelah event sengaja digunakan sebagai periode refinement dan stabilisasi untuk menemukan celah kegunaan, memvalidasi perhitungan, memperkuat kesiapan server, memperbaiki responsiveness, dan memastikan alur kerja yang kritis bagi bisnis berjalan andal sebelum dipakai penuh.

Setelah periode refinement, setiap sistem masuk ke tahap transisi penggunaan operasional. Penggunaan berulang dan manfaat berkelanjutan tidak diasumsikan selesai; keduanya diverifikasi melalui monitoring bulanan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan DekatLokal.

Five systems were delivered and accepted through initial UAT. The post-handover stabilization cycle protects data accuracy, usability, and production readiness before daily operational use.

Initial UAT dan handover menjadi bukti implementasi bahwa solusi telah diterima oleh masing-masing UMKM. Manfaat berkelanjutan, penggunaan berulang, dan outcome operasional tetap diverifikasi melalui monitoring; laporan ini tidak menganggap adopsi jangka panjang selesai tanpa data tindak lanjut.

[PDF REPORT](#)

AI Co-Creation Lab Project Monitoring Report

Versi unduh dari laporan progres pelaksanaan, capaian target, kendala, solusi, pembelajaran, dokumentasi kegiatan, dan rencana tindak lanjut.

STATUS

**Completed · Updated 20
Aug 2026**

USE

**Final Presentation ·
Implementasi Project**

FORMAT

PDF · 28 pages · 7.61 MB

Isi Project Monitoring Report

Tujuh bagian ini menjaga laporan tetap utuh sebagai sumber materi Implementasi Project pada Final Presentation.

01

Progres Pelaksanaan

Delapan tahap dari validasi masalah, co-creation, functional MVP, initial UAT, handover, refinement, transisi penggunaan, sampai monitoring bulanan.

02

Capaian Target

Target mahasiswa, UMKM, tim, functional MVP, initial UAT, handover, infrastruktur, assessment, dan refleksi dibandingkan dengan catatan implementasi.

03

Kendala

Format satu hari, kesiapan produksi, pembagian tanggung jawab pasca-event, dan kebutuhan membuktikan penggunaan berulang.

04

Solusi

Refinement pasca-handover, quality control, technical stewardship, escalation support, dan monitoring berkala.

05

Pembelajaran

Enam pembelajaran implementasi tentang pengguna, MVP, AI, tim campuran, deployment yang bertanggung jawab, dan dukungan setelah handover.

06

Dokumentasi Kegiatan

Foto aktual workshop, diskusi mahasiswa–UMKM, hands-on build, prototype review, pitching, dan dokumentasi kelompok.

07

Rencana Tindak Lanjut

Stabilisasi, pencatatan isu, validasi penggunaan operasional, review sistem bulanan, dan pembaruan model replikasi.


Capaian terhadap Target Awal

Indicator	Target	Achievement
Students	20	20
UMKM	5	5
Co-Creation Teams	5	5
Functional MVPs	5	5
Initial UAT	5	5
System Handover	5	5
Domain & Hosting	5	5 activated
Pre-test	20	20
Post-test	20	20
Reflection	20	20

Every primary delivery target of the pilot was achieved.

Dari Validasi Masalah sampai Monitoring Bulanan

Lima tahap pertama telah dituntaskan sebagai bagian dari GEP. Tiga tahap berikutnya adalah mekanisme keberlanjutan yang berjalan setelah program formal selesai.

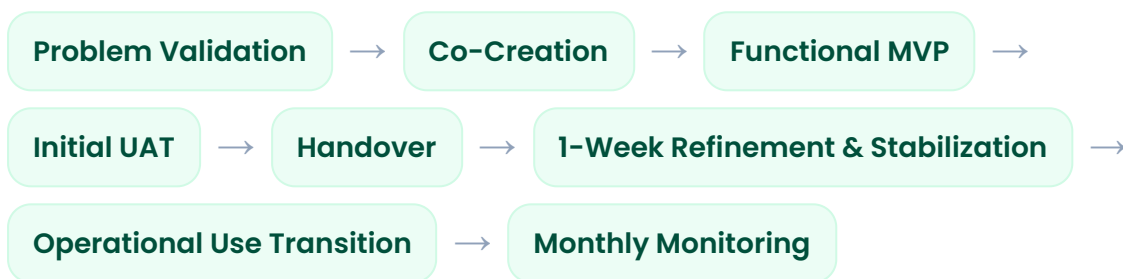

01

● Completed

Problem Validation

Lima UMKM dipilih berdasarkan masalah operasional nyata dan kebutuhannya divalidasi sebelum event melalui problem brief.

02

● Completed

Co-Creation

Dua puluh mahasiswa dalam lima tim campuran bekerja langsung bersama pemilik usaha sepanjang hari pelaksanaan.

03

● Completed

Functional MVP

Setiap tim menyelesaikan satu MVP fungsional yang menuntaskan core workflow utama usahanya.

04

● Completed

Initial UAT

Kelima UMKM menguji sistem secara langsung dan menerima arah solusi untuk dilanjutkan.

05

● Completed

Handover

Akses, panduan penggunaan, dan tanggung jawab steward diserahkan kepada masing-masing UMKM.

06

● Post-Program Continuity

Refinement & Stabilization

Siklus satu minggu setelah handover untuk memastikan akurasi data, perhitungan, izin akses, responsiveness, dan kesiapan server.

07

● Structured Transition

Operational Use Transition

Setelah stabilisasi, sistem diarahkan ke penggunaan operasional; penggunaan berulang dan manfaatnya diverifikasi melalui monitoring.

Monthly Monitoring

Pemantauan penggunaan, kegunaan, akurasi, dan kebutuhan perbaikan dijadwalkan serta dicatat setiap bulan.

Five Systems Delivered

Lima sistem yang dibangun bersama pemilik usahanya, diuji melalui initial UAT, dan telah diserahterimakan. Setiap tampilan di bawah adalah tangkapan layar sistem yang benar-benar dibangun.



SYSTEM 01

Eyfa Natural Oil

POS, Stock, HPP & Reporting System

Pencatatan penjualan, stok, HPP, dan laporan usaha yang sebelumnya manual.

● Handed Over · Functional · UAT Accepted

- ✓ Refinement pasca-program ditangani DekatLokal.
- ✓ Pemeriksaan produksi memprioritaskan stok, HPP, alur transaksi, dan keandalan pelaporan.


STEWARD

DekatLokal
Technical
Team

DEKATLOKAL

Technical
Mentor and
Escalation
Support

SOLUTION DOCUMENTATION



SYSTEM 02



Sukmajahe Sarabba Makassar

Outlet & Consignment Tracking System

Pelacakan stok titip jual dan status pembayaran di banyak outlet.

● Handed Over · Functional · UAT Accepted

- ✓ Alur outlet dan konsinyasi sudah berjalan.
- ✓ Stabilisasi termasuk dalam dukungan pasca-program.


STEWARD

**Student
Technical
Steward**

DEKATLOKAL

**Technical
Mentor and
Escalation
Support**

SOLUTION DOCUMENTATION





SYSTEM 03

Markisa Bintang Jaya

Finance & Stock Management System

Pencatatan keuangan dan stok yang terpisah dan sulit ditinjau ulang.

● Handed Over · Functional · UAT Accepted

- ✓ Sisi admin ikut dikembangkan mahasiswa.
- ✓ UMKM menguji langsung dan menerima core workflow.
- ✓ Stabilisasi server termasuk dalam dukungan pasca-program.

STEWARD

**Student
Technical
Steward**

DEKATLOKAL

**Technical
Mentor and
Escalation
Support**

SOLUTION DOCUMENTATION





SYSTEM 04

Kira Kira Michi

Digital Loyalty Card System

Program loyalitas pelanggan yang sebelumnya bergantung pada kartu fisik.

● Handed Over · Functional · UAT Accepted

- ✓ Peningkatan UI/UX dan responsiveness.
- ✓ Interaksi customer-facing dirapikan sebelum peluncuran loyalitas penuh.
- ✓ Approval admin dan perjalanan pelanggan disiapkan untuk penggunaan berkelanjutan.


STEWARD

**DekatLokal
Technical
Team**

DEKATLOKAL

**Technical
Mentor and
Escalation
Support**

SOLUTION DOCUMENTATION





SYSTEM 05

Dapur Andist

Financial Management System

Pencatatan pemasukan, pengeluaran, HPP, dan omzet yang belum terstruktur.

● Handed Over · Functional · Realtime Core Flow Working · UAT Accepted

- ✓ Input dan data realtime sudah berjalan.
- ✓ Alur keuangan diperiksa silang sebelum dipakai penuh setiap hari.
- ✓ Akurasi perhitungan dan pelaporan menjadi prioritas kesiapan produksi.


STEWARD

**Student
Technical
Steward**

DEKATLOKAL

**Technical
Mentor and
Escalation
Support**

SOLUTION DOCUMENTATION



Why We Did Not Stop at “It Works”

Prototype yang berfungsi belum sama dengan sistem bisnis yang siap produksi. Karena solusi ini menangani data pelanggan, catatan stok, aktivitas loyalitas, dan informasi keuangan yang nyata, DekatLokal menerapkan siklus stabilisasi tambahan setelah handover.

✓ Akurasi data

✓ Akurasi perhitungan keuangan

✓ Keandalan server

✓ Pengalaman yang responsif

✓ Akses pengguna

✓ Izin per peran

✓ Konsistensi operasional

✓ Kepercayaan pemilik usaha

For us, refinement is not unfinished work. It is responsible deployment.

Respons yang Menjaga Implementasi Tetap Bertanggung Jawab

Kendala ditulis sebagai batas implementasi yang benar-benar perlu dikelola, bukan sebagai outcome yang sudah dianggap selesai.

01

KENDALA

Format implementasi satu hari sangat intensif.

RESPONS / SOLUSI

Penyempurnaan tidak dipaksakan selesai di ruang acara; refinement dan quality control dilanjutkan setelah handover.

02

KENDALA

Functional MVP belum otomatis sama dengan sistem yang siap dipakai secara konsisten.

RESPONS / SOLUSI

Stabilisasi memeriksa akurasi data, perhitungan, akses, responsiveness, server, dan alur kerja prioritas.

03

KENDALA

Tanggung jawab pemeliharaan dapat terputus setelah peserta meninggalkan event.

RESPONS / SOLUSI

Setiap sistem memiliki steward dan jalur eskalasi ke tim teknis DekatLokal.

04

KENDALA

Handover membuktikan penerimaan solusi, tetapi belum membuktikan adopsi berulang.

RESPONS / SOLUSI

Penggunaan, kegunaan, akurasi, isu, dan kebutuhan perbaikan dipantau secara berkala tanpa mengklaim outcome sebelum datanya tersedia.

Final Stewardship Model

Tiga sistem dipegang student technical steward dan dua sistem ditangani langsung tim teknis DekatLokal. Kelimanya tetap berada dalam dukungan DekatLokal.

01

UMKM

System User and Business Owner

- Menggunakan sistem dalam operasional harian.
- Menentukan kebutuhan bisnis yang perlu diprioritaskan.
- Memberi umpan balik atas penggunaan nyata.

02

Technical Steward

First-Line Maintenance

- Menangani bug ringan dan pemeliharaan dasar.
- Menjaga komunikasi dengan pemilik usaha.
- Mencatat improvement log.

03

DekatLokal

Program Owner, Technical Mentor, Quality Controller, and Escalation Support

- Quality control dan arahan arsitektur.
- Mentoring student steward.
- Eskalasi isu dan penjagaan kontinuitas.

Eyfa Natural Oil

● DekatLokal Technical Team

Sukmajahe Sarabba Makassar

● Student Technical Steward

Markisa Bintang Jaya

● Student Technical Steward

Kira Kira Michi

● DekatLokal Technical Team

Dapur Andist

● Student Technical Steward

Stewardship is distributed, but accountability remains centralized through DekatLokal.

The UMKM is never left alone with the system after handover.

Monthly System Health & Adoption Monitoring

Pemantauan menjadi bagian dari model dukungan, bukan evaluasi sekali jalan setelah acara.

✓ Penggunaan aktif

✓ Penggunaan berulang

✓ Isu kegunaan

✓ Akurasi perhitungan

✓ Kesehatan server

✓ Log bug dan dukungan

✓ Permintaan perbaikan

✓ Kecocokan alur kerja

✓ Umpan balik UMKM

✓ Relevansi operasional

Monitoring is embedded into the support model, not treated as a one-time evaluation.

Owner, Waktu, Status, dan Indikator Keberhasilan

Tindak lanjut dibedakan dari hasil aktual agar pembaca dapat melihat apa yang telah dicatat dan apa yang masih diverifikasi.

01

Refinement & stabilization

● Recorded implementation step

OWNER

DekatLokal Technical Team + Technical Steward

WAKTU

Siklus awal pasca-handover

INDIKATOR KEBERHASILAN

Core workflow, akses, perhitungan, responsiveness, dan kesiapan server diperiksa.

02

Operational-use check

● Monitoring ongoing

OWNER

UMKM + Technical Steward

WAKTU

Setelah stabilisasi dan saat penggunaan berlangsung

INDIKATOR KEBERHASILAN

Pengguna dapat menjalankan alur kerja prioritas dan mencatat isu yang ditemukan.

03

Issue & improvement log

● Ongoing

OWNER

Technical Steward + DekatLokal

WAKTU

Setiap ada temuan penggunaan

INDIKATOR KEBERHASILAN

Temuan memiliki prioritas, penanggung jawab, tindak lanjut, dan status penyelesaian.

04

Monthly system review

● Scheduled continuity mechanism

OWNER

DekatLokal + UMKM

WAKTU

Bulanan

INDIKATOR KEBERHASILAN

Penggunaan, kegunaan, akurasi, kesehatan server, dan relevansi operasional ditinjau kembali.

05

Replication learning update

- Playbook refined; future updates evidence-led

OWNER

DekatLokal

WAKTU

Setelah siklus monitoring menghasilkan temuan baru

INDIKATOR KEBERHASILAN

Temuan pilot diterjemahkan menjadi perbaikan playbook, toolkit, dan desain program berikutnya.

Project Documentation

Dokumentasi kegiatan memakai arsip foto aktual AI Co-Creation Lab Makassar yang telah dikurasi pada Process Documentation Week 3. Tidak ada stock image yang digunakan.

Workshop

Hands-on co-creation

Diskusi mahasiswa dan UMKM

Pengembangan prototype

Pitching

Momen bersama stakeholder

Dokumentasi kelompok



PESERTA MENYIMAK SESI DI RUANG ACARA DENGAN IDENTITAS DEKATLOKAL DI LAYAR.

Enam Pembelajaran Utama

01 Listen Before Build

Percakapan dengan pengguna nyata mengubah arah solusi yang semula sudah diyakini tim.

02 Simple Can Be More Valuable

UMKM tidak selalu membutuhkan sistem kompleks. Yang dibutuhkan adalah alur yang benar-benar terpakai.

03 AI Is an Accelerator, Not the Goal

Pemahaman masalah tetap menjadi fondasi. AI mempercepat, bukan menggantikan proses berpikir.

04 Mixed Teams Create Shared Learning

Teknologi tidak harus dimonopoli mahasiswa Informatika agar sebuah tim dapat membangun sesuatu.

05 Responsible Deployment Matters

MVP yang berfungsi tetap layak diperiksa silang untuk kesiapan produksi sebelum dipakai harian.

06 Handover Needs Support

Sistem berlanjut melalui stewardship dan mentorship DekatLokal, bukan melalui penyerahan sekali jalan.

One-Day Format Is Intensive

Dalam satu hari peserta harus memahami konteks usaha, belajar, mendefinisikan masalah, membangun, menguji, dan melakukan pitching.

RESPONSE

DekatLokal melanjutkan refinement setelah event sehingga hasil hari itu berlanjut menjadi sistem yang dipakai.

RECOMMENDED REPLICATION MODEL

Model replikasi yang direkomendasikan menggunakan format dua hari, dengan Day 1 untuk Understand & Design dan Day 2 untuk Build, Test & Improve.

Day 1 — Understand & Design



Day 2 — Build, Test & Improve

DELIVERABLES

Output yang telah dihasilkan

- ✓ Executive summary pelaksanaan dan kelanjutannya setelah handover.
- ✓ Siklus implementasi delapan tahap beserta mekanisme keberlanjutannya.
- ✓ Lima sistem yang diserahkan dengan tangkapan layar dan logo aslinya.
- ✓ Tabel target dan capaian yang seluruhnya terpenuhi.
- ✓ Model stewardship dan monitoring bulanan.
- ✓ Enam pembelajaran implementasi.
- ✓ Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut dengan owner serta indikator keberhasilan.
- ✓ Project Monitoring Report dalam format PDF.

SIAP DISALIN

Deskripsi Progress Awardee

Project Monitoring Report telah diselesaikan. Laporan memuat progres pelaksanaan, capaian target, kendala dan respons, lima sistem yang telah diserahkan beserta tangkapan layar aslinya, pembelajaran, dokumentasi kegiatan, model stewardship, serta rencana tindak lanjut dan monitoring bulanan. Laporan ini menjadi materi bagian Implementasi Project pada Final Presentation.



Pranala/Link Progres

<https://event.dekatlokal.com/ai-co-creation-lab-makassar/progress/project-completion-monitoring>

URL laporan: <https://event.dekatlokal.com/ai-co-creation-lab-makassar/progress/project-completion-monitoring>

Terakhir diperbarui: 20 Agustus 2026
